


【令和6年度 生活道路除排雪の試験施工】現場状況(西区南地区)

掲載路線: 削り出し路線 道路幅員8m 2月28日作業実施箇所

ア. 作業8日前(2月20日)	
圧雪厚 (路面の雪の厚さ)	約20cm
通行幅	約4.0m

※右記の『生活道路の除雪水準』が確保されている状況

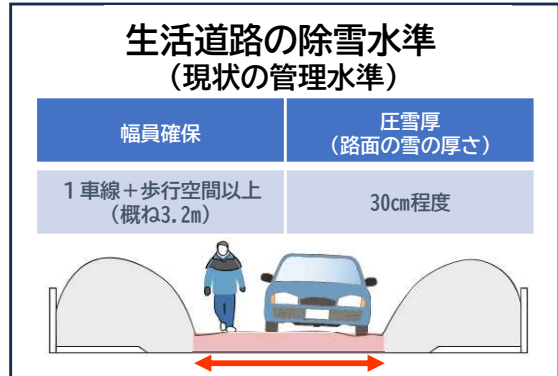

『札幌市冬のみちづくりプラン2018』より

イ. 作業前日(2月27日)	
圧雪厚 (路面の雪の厚さ)	約15cm
通行幅	約4.5m

※2月20日~27日間の平均最高気温が過去5年平均値と比較し約1.1℃高く、雪解けが進んでおり、『生活道路の除雪水準』を確保できている状況



ウ. 作業状況(2月28日) ①→②	
削り出し機械	タイヤショベル
積込機械	バックホウ

※シーズンを通した道路環境(除雪水準以上)確保のため、試験施工を実施
※作業状況写真は同地区別路線
※掲載路線は削り出し路線のため、積込路線への削り出し作業を行う



エ. 作業後(3月2日)	
圧雪厚 (路面の雪の厚さ)	0cm
通行幅	約5.6m

※3月1日~2日間の、平均最高気温が過去5年平均値と比較し約4.4℃高く、雪解けが進んでおり、『生活道路の除雪水準』を確保できている状況

